


Impermeabilização

Active

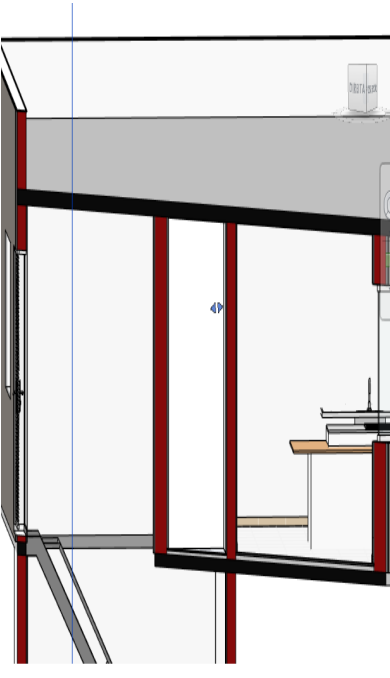

Impermeabilização			
Item	Espessura	Tipo de Impermeabilização	Locais
Radier	1mm	Argamassa Polimérica	Na extensão da saída
Piscina	5mm	Argamassa Polimérica	Na extensão das paredes e pisos da piscina
Casas de Bombas	5mm	Argamassa Polimérica	Na extensão das parede e pisos das casas de bombas
Lajes de Cobertura	3,3 cm	Manta Líquida + Proteção Mecânica	Em toda a extensão da laje
Pisos Áreas Molhadas	1mm	Argamassa Polimérica + Tela de Poliéster	Em toda a extensão do piso do banheiro.
Paredes Áreas Molhadas	1mm	Argamassa Polimérica	20 cm em toda a extensão das paredes dos banheiros
Paredes Áreas Molhadas	1mm	Argamassa Polimérica	1,5m de altura em toda a extensão das paredes do box
Paredes de Fachada	1mm	Argamassa Polimérica	Sobe 60 cm na parede
Paredes e Pisos de Área Molhada	1mm	Tela de Poliéster	Em arestas vivas e encontro de paredes com pisos, avançando 20cm para a face impermeabilizada, com exceção da copa da Guarita

Descrição

Colocar camadas de impermeabilização conforme BEP, por favor

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-10-29T15:39:48+00:00

Vencimento

2021-11-04T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-10-29T15:39:48+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
