


Laje D

Closed

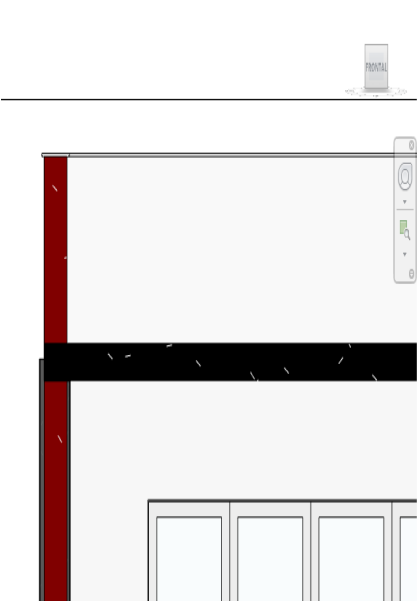


Tetos

Acabamentos de Tetos

Acabamentos de Teto	
Item	Locais
Forros de Gesso	Nos banheiros da torre
Sancas de Gesso	Na cozinha da torre
Estucamento de Teto	Em todos a extensão das lajes sem forro
Textura de Teto	Em todos a extensão das lajes sem forro

Impermeabilização

Impermeabilização			
Item	Espessura	Tipo de Impermeabilização	Locais
Raízer	1mm	Argamassa Polimérica	Na extensão da sala
Piscina	5mm	Argamassa Polimérica	Na extensão das paredes e pisos da piscina
Casos de Bombas	5mm	Argamassa Polimérica	Na extensão das paredes e pisos das casas de bombas
Lajes de Cobertura	3,3 cm	Manta Líquida + Proteção Mecânica	Em toda a extensão da laje
Pisos Áreas Molhadas	1mm	Argamassa polimérica + Teia de Poliéster	Em toda a extensão do piso do banheiro, 20 cm em toda a extensão das paredes dos banheiros
Paredes Áreas Molhadas	1mm	Argamassa Polimérica	1,5m de altura em toda a extensão das paredes do box
Paredes de Fachada	1mm	Argamassa Polimérica	Sobe 60 cm na parede Em arestas vivas e encontro de paredes

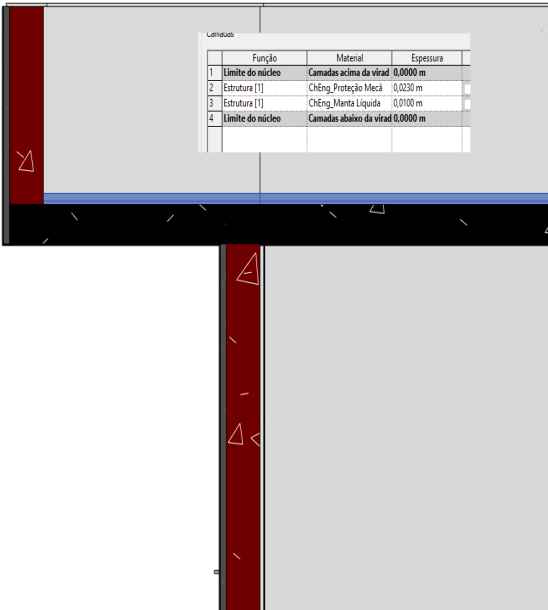

Descrição

Por gentileza, modelar as camadas de laje conforme BEP no lazer D

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-09-21T14:04:05+00:00

Vencimento

2021-09-27T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Visto na R01 que as camadas da laje foram modeladas	2021-10-28T20:49:54+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Camadas da Laje modeladas conforme BEP sem comentários	2021-10-08T13:46:19+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
		2021-09-21T14:04:05+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
